




UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA
DIRETORIA DE OBRAS - DOB

PROINFRA
DIRETORIA DE OBRAS

Área Acadêmica Saúde

Prédio Novo

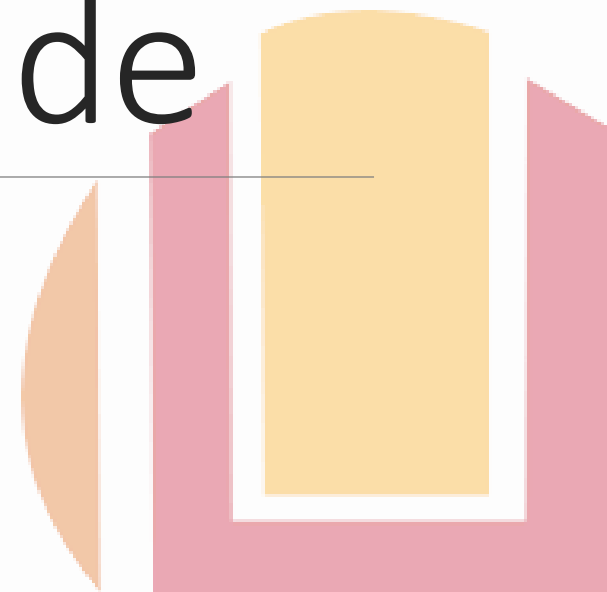




Histórico de Investimentos

Serviço	Período	Valor aproximado (R\$)
Obra Civil I	2012-2015	2.500.000,00
Obra Civil II	2016-2021	16.800.000,00
Climatização	2022-2024	2.500.000,00
Dados e Telefonia*	2022	260.000,00
Dados e Telefonia 3º e 4º pav.	2023	Em análise
Manutenção de Elevadores	2023-2024	75.000,00
Reparo de Coberturas	2023	8.000,00
Impermeabilização dos Poços	2023	22.000,00
Subestação	2023-2024	600.000,00
Elétrica Provisória	2023	33.000,00
	Total	23.000.000,00



Status da Execução

- Obra Civil;
- Climatização e Ventilação Mecânica;
- Subestação Transformadora de Energia;
- Instalações de Rede de Dados e Telefonia;
- Instalações de Gás (GLP);

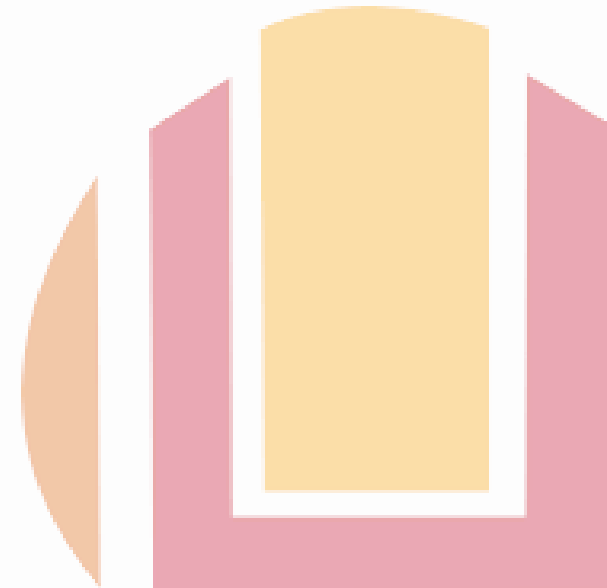



Obra Civil


- Impermeabilização dos poços dos elevadores;
- Reparo da pintura das fachadas;
- Reparo de infiltrações na pele de vidro;





Climatização e Ventilação Mecânica


- Percentual Executado: 65%;
- Instalação das Unidades Internas: 65%
- Instalação das Unidades Externas: 65%
- Instalação da Rede de Dutos de Ventilação: 70%
- Instalação de Ventiladores da Renovação de Ar: 65%

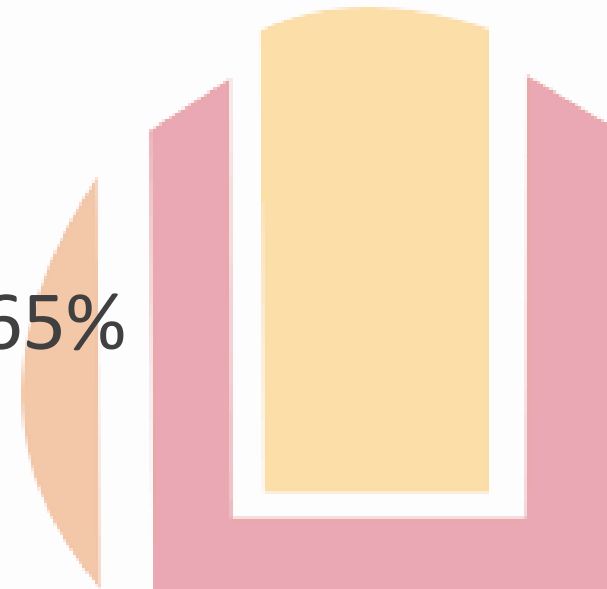



Subestação Transformadora de Energia

- Objeto contratado (assinado em 07/12/2023);
- Previsão de Início: Janeiro/2024
- Prazo de execução 90 dias
- Previsão de conclusão: Abril/2024

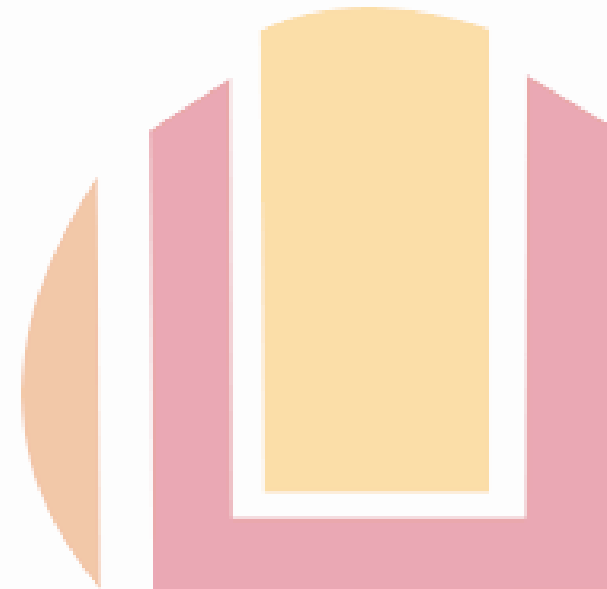



Instalações de Rede de Dados e Telefonia


- Executadas as instalações dos Pavimentos 3 e 4;
- Executado link de internet;
- Contratação dos remanescentes em etapa de orçamento;
- Previsão de contratação: fevereiro/2024;
- Previsão de início: março/2024;
- Previsão de conclusão: maio/2024





Instalações de Gás (GLP)

- Remanescentes em fase de orçamento;
- Previsão de Contratação: fevereiro/2024;
- Previsão de início: março/2024;
- Prazo de execução: 60 dias ;
- Previsão de conclusão: maio/2024;

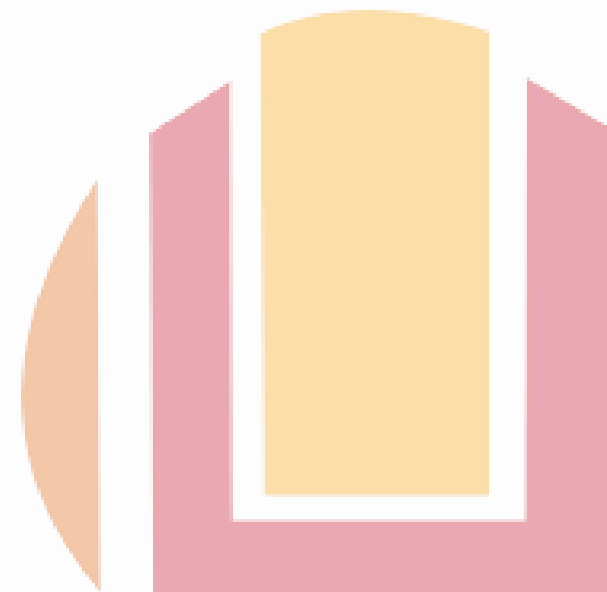



Planta Baixa – 3º Pavimento

